

長谷川 仁美様邸

作業報告書



施工前



施工前





1 外壁 高圧洗浄 施工中



2 外壁 高圧洗浄 施工完了



3 土間 高圧洗浄 施工中



4 土間 高圧洗浄 施工完了



5 既設コーキング 撤去 施工中



6 既設コーキング 撤去 施工完了





7 コーキング 施工中



8 コーキング 施工完了



9 軒天 上塗り 1回目 施工中



10 軒天 上塗り 1回目 施工完了



11 軒天 上塗り 2回目 施工中



12 軒天 上塗り 2回目 施工完了





13 外壁1F 下塗り 施工中




14 外壁1F 下塗り 施工完了



15 外壁1F 中塗り 施工中



16 外壁1F 中塗り 施工完了

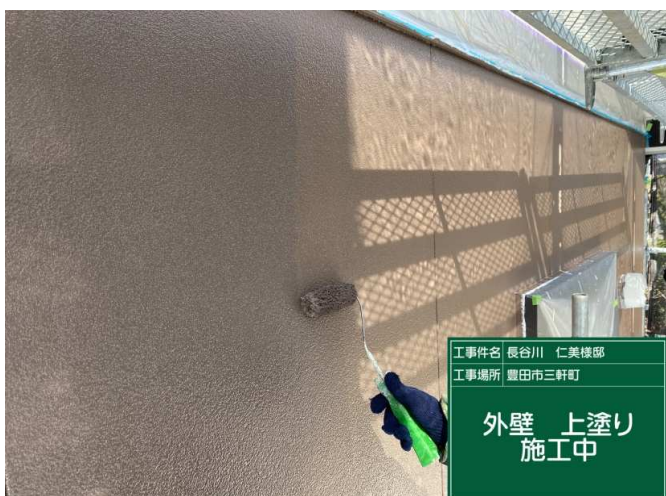

17 外壁1F 上塗り 施工中



18 外壁1F 上塗り 施工完了





19 外壁2F 下塗り 施工中



20 外壁2F 下塗り 施工完了



21 外壁2F 上塗り 施工中  
 (中塗りの写真を撮り忘れてしまいました)



22 外壁2F 上塗り 施工完了



23 鼻隠し 下塗り 施工中



24 鼻隠し 中塗り 施工中






25 鼻隠し 上塗り 施工中



26 鼻隠し 上塗り 施工完了



27 雨戸 上塗り 1回目 施工中

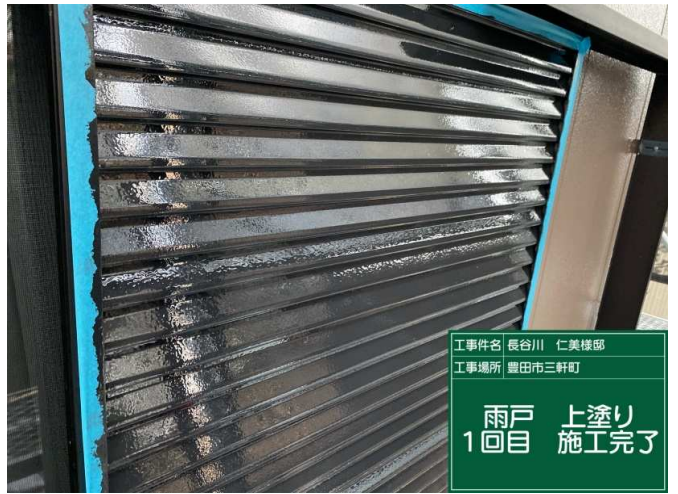

28 雨戸 上塗り 1回目 施工完了




29 雨戸 上塗り 2回目 施工中



30 雨戸 上塗り 2回目 施工完了



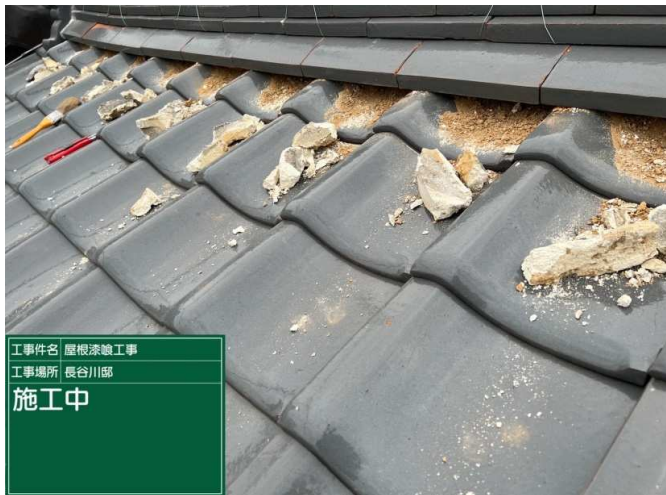

31 大屋根 既設漆喰撤去 施工中




32 大屋根 漆喰 施工中



33 大屋根 漆喰 施工完了



34 大屋根 漆喰 施工完了

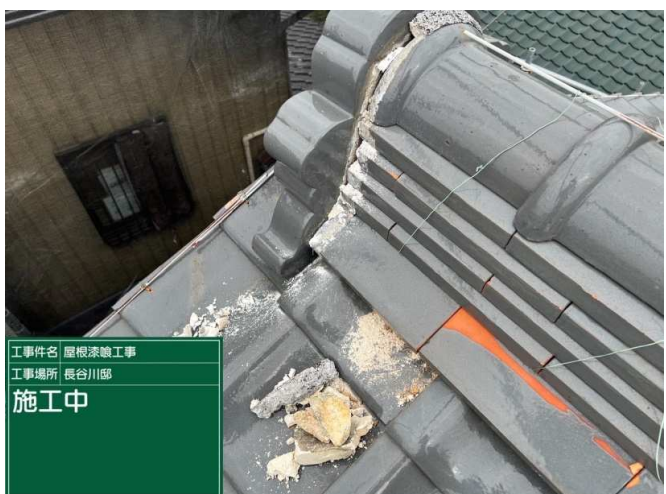

35 鬼廻り 漆喰撤去 施工中




36 鬼廻り コーキング 施工中






37 鬼廻り コーキング 施工完了

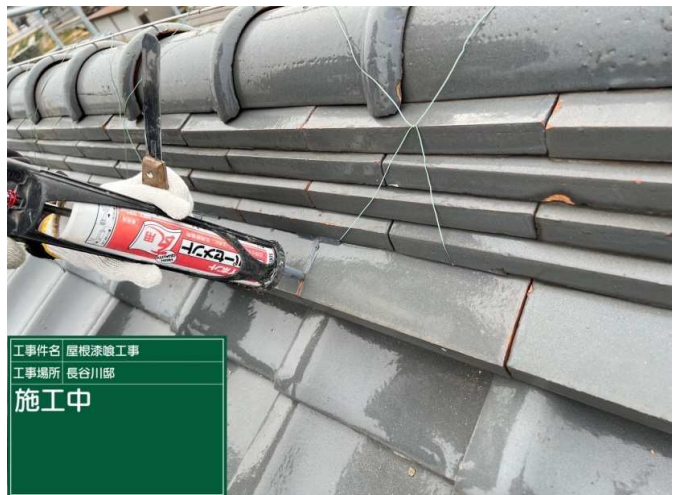

38 棟関係 コーキング 施工中




39 鬼廻り 漆喰 施工完了

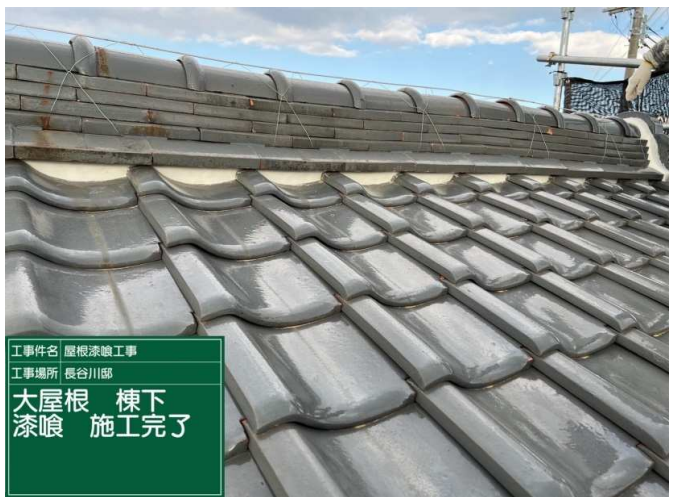

40 大屋根 棟下 漆喰 施工完了



41 下屋 既設漆喰撤去 施工中

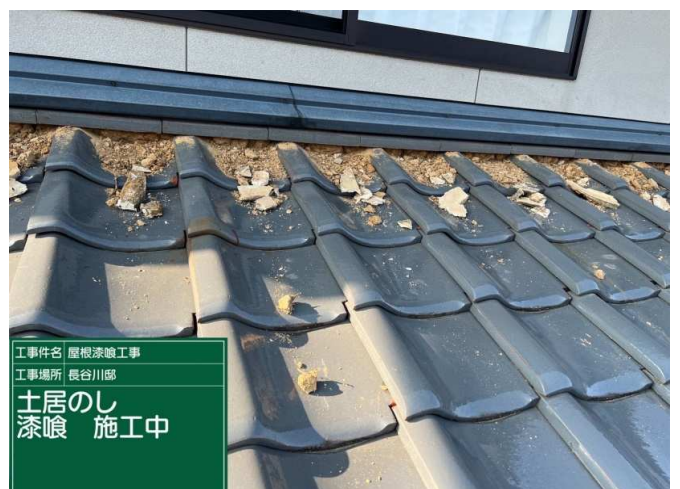

42 下屋 既設漆喰撤去 施工完了






43 土居のし 漆喰 施工中




44 土居のし 漆喰 施工完了




45 土居のし 漆喰 施工完了

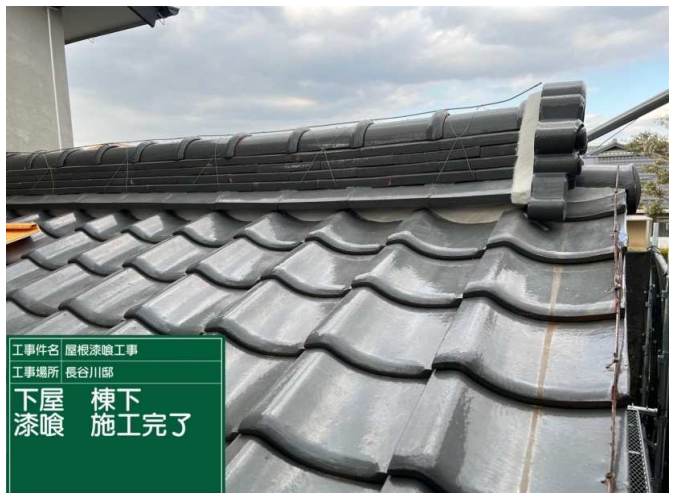

46 下屋 棟下 漆喰 施工完了

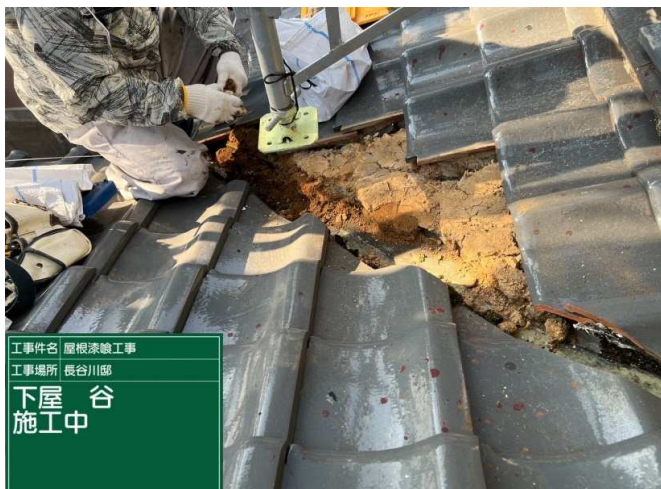

47 下屋 谷樋 施工中

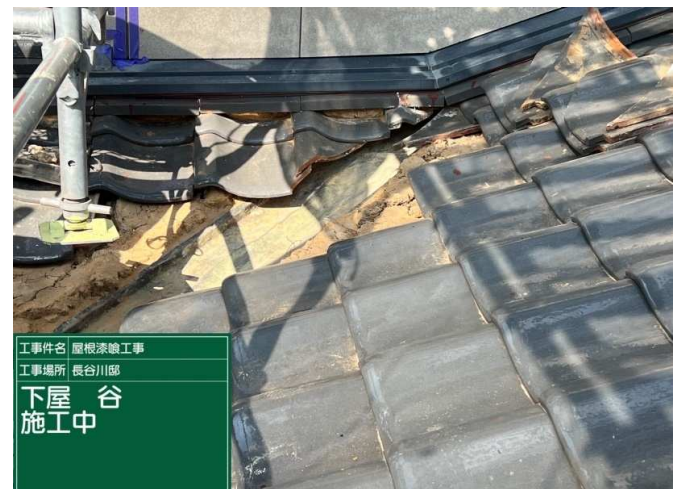


48 下屋 谷樋 施工中





49 下屋 谷樋 施工中

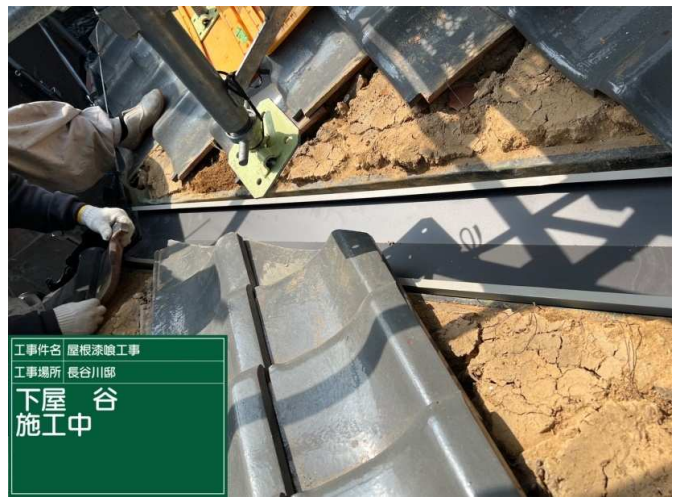

50 下屋 谷樋 施工中



51 下屋 谷樋 施工完了



52 下屋 谷樋 施工完了



53 施工完了(ドローン撮影)



54 施工完了(ドローン撮影)





55 施工完了(ドローン撮影)



56 施工完了(ドローン撮影)



57 施工完了(ドローン撮影)



58 施工完了(ドローン撮影)





施工後



施工後
